

تقرير

بما تم من إنجازات منذ تولي

أ.د/ رمضان عبد الحميد محمد الطنطاوي

مهام رئاسة جامعة دمياط

في الفترة من 22/9/2014 حتى يونيو 2016

المحاور الرئيسية:

1. الإنشاءات الجامعية

- السور

- المرحلة الأولى

- المرحلة الثانية

- المرحلة الثالثة

- المرحلة الرابعة

- البنية التحتية

2. الكليات والخدمات الجامعية

3. الكليات المزعم إنشاؤها

1. الإنشاءات الجامعية:-

السور:

1. تقوم شركة المقاولون العرب بإنشائه، وتضمن الإنشاء بنود مستجدة وهى أعمال إحلال التربة تحت السور، وتم اصدار أمر شغل للشركة المنفذة (بمعرفة إدارة فرع الجامعة آنذاك) لتنفيذ البند المستجد (إحلال التربة) وذلك دون أخذ موافقة السلطة المختصة في ذلك الوقت، مما ترتب عليه توقف صرف مستحقات الشركة المنفذة (في حدود 2 مليون جنيه).

2. تم عرض مذكرة بهذا الشأن على معالي أ.د/ وزير التعليم العالي للعرض على معالي رئيس مجلس الوزراء للتكرم بالموافقة واعتماد ما تم من اجراءات، وقد تمت الموافقة بتاريخ 17/9/2014م.

1. الإنشاءات الجامعية:-

السور:

3. وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة فنية على مستوى عالي قامت بحصر البنود المستجدة، ودراسة الأسعار الخاصة بها لأعمال السور، وإصدار أمر التشغيل للشركة المنفذة لاستكمال وانهاء إنشاء السور، وتم انتهاء التراخيص اللازمة لإنشاء السور، وجاري التنفيذ حالياً بإشراف مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة.

4. جاري العمل حالياً في تشطيبات البوابات الأربعة لحرك الجامعة، كما أنه من المقرر الانتهاء من تشطيب البوابة الشرقية قبل نهاية يونيو 2016.



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الأولى:

- تم الانتهاء من تسليم أعمال التعاقد الأصلي (خرسانة ومباني) بمحضر تسليم ابتدائي بتاريخ 19/2/2015.
- تم البدء في أعمال التشطيب من قبل الشركة الثلاثية للإنشاءات والتعمير التي تم ترسيه أعمال التشطيب عليها.
- تم افتتاح التشغيل التجريبي بتاريخ 3/4/2016.
- تم الاجتماع مع الشركات المسؤولة عن تنفيذ المراحل الإنشائية بالموقع بتاريخ 13/4/2016 ، ومن المزمع الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى بحرم الجامعة الجديد قريباً.



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الأولى:

- تضم المرحلة الأولى عدد (30) مدرج و (40) قاعة دراسية تستوعب عشرة آلاف طالب في ذات التوقيت.
- تضم أيضاً عدد (79) مكتب لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.
- بلغت استثمارات المرحلة الأولى 121 مليون جنيه.



متابعة المرحلة الأولى 21/10/2014



متابعة المرحلة الأولى 17/11/2014



عزل أسطح المرحلة الأولى 14/2/2015



عزل أسطح المرحلة الأولى 19/2/2015



بدء الشركة الثلاثية في تشطيبات المرحلة الأولى

24/2/2015



تفقد عينات تشطيبات المرحلة الأولى 1/3/2015



تشطيات المرحلة الأولى 3/6/2015



تشطيات المرحلة الأولى 3/6/2015



تشطيبات المرحلة الأولى 3/6/2015



تشطيبات المرحلة الأولى 27/12/2015



تشطيات المرحلة الأولى 30/3/2016



التشغيل التجريبي 3/4/2016



تشطيات المرحلة الأولى 7/4/2016



تشطيبات المرحلة الأولى - الجهة الغربية



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الثانية:

1. تم إسناد أعمال المرحلة الثانية لشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال الإنشاءات والمباني الخرسانية وأعمال التشطيبات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت (87,681,426) فقط سبعة وثمانون مليوناً، وستمئة وواحد وثمانون ألفاً، وأربعمائة وستة وعشرون جنيهاً، والتي كان من المتوقع الانتهاء منها خلال 36 شهراً، بدءاً من سبتمبر 2011.

2. تضم المرحلة الثانية أيضاً عدد (30) مُدرج و(40) فصل دراسي، تتسع لأكثر من (10,000) طالب، وتشمل كذلك على عدد (79) مكتب إداري

3. تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية بالمرحلة، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ أعمال التشطيبات، ومن المتوقع تسليم المرحلة

في أغسطس 2016.



متابعة المرحلة الثانية 21/10/2014



المرحلة الثانية 18/4/2015



متابعة المرحلة الثانية 20/6/2015



متابعة المرحلة الثانية 16/2/2016



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الثالثة:

1. وهي عبارة عن الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمدرجين الرئيسين للمرحلة الأولى والثانية داخل المنطقة التعليمية، والتي لم يكن طرحاً من قبل بمناقصتي المرحلة الأولى والثانية، وتم طرح هذه المناقصة خلال العام المالي 2012/2013 بتكلفة إجمالية بلغت (51,671,602) فقط واحد وخمسون مليوناً، وستمائة واحد وسبعون ألفاً، وستمائة واثنان جنيه، والتي كان من المتوقع الانتهاء منها خلال 24 شهراً.

2. تستوعب المرحلة الثالثة بكلا المدرجين 2000 «ألفان طالب».



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الثالثة:

3. كان من المقرر الانتهاء من أعمال هذه المرحلة في 31/3/2016، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع شركة المقاولون العرب، **ولكن تم تعديل مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال شاملة التشطيبات ليصبح في 30/8/2016**، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الشركة في الاجتماع الذي عُقد يوم 6/6/2015 بحضور معالي أ.د/ وزير التعليم العالي والسيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
4. يتم العمل حالياً في أعمال المدرجين بالتوازي بعد مخاطبة كافة الجهات للعمل بالتوازي في المدرجين.



مدرج (أ) - من الزاوية الجنوبية قبل بدء العمل 21/10/2014



مدرج (أ) - من سطح المرحلة الأولى 14/2/2015



مدرج (أ) – 15/4/2015



مدرج (أ) - من الزاوية الجنوبية 3/6/2015



مدرج (أ) - من الزاوية الغربية - من داخل المرحلة الأولى

24/8/2015



متابعة أعمال تسليح سطح مدرج (أ) – 10/9/2015



متابعة التجهيز لأعمال خرسانة سطح مدرج (أ) - 11/10/2015




مدرج (أ) - من الزاوية الشرقية 16/2/2016



مدرج (ب) 17/10/2015



تفقد بدء العمل بمدرج (ب) 14/11/2015 بعد مخاطبة كافة الجهات المعنية

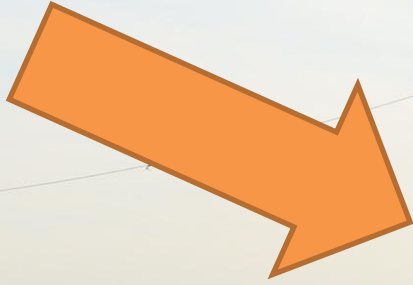

متابعة أعمال مدرج (ب) 27/12/2015



متابعة أعمال مدرج (ب) 13/1/2016



متابعة أعمال مدرج (ب) 31/1/2016



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الرابعة:

1. وهى عبارة عن أعمال اعتيادية وتشطيبات لعدد (62 معمل) خاص بالكليات الأدبية فقط.
2. تم إسناد أعمال هذه المرحلة خلال العام المالي 2013/2014 بالأمر المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة إجمالية تبلغ (66,650,000) فقط ستة وستون مليوناً، وستمائة وخمسون ألف جنيه، وكان من المتوقع الانتهاء من أعمالها خلال 18 شهراً.
3. تم دفع (50%) من القيمة الاجمالية للأعمال كدفعة مقدمة، خلال العام المالي 2013/2014، وعلى الرغم من ذلك **كان العمل متوقفاً بها لمدة ثمانية أشهر كاملة ولم يتم تنفيذ أي عمل بها.**



1. الإنشاءات الجامعية:-

المرحلة الرابعة:

4. تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستئناف العمل بالمرحلة الرابعة، وتم استئناف العمل في **سبتمبر 2014**، ويسير العمل بشكل منتظم، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة التي قد تم الاتفاق عليها عند توقيع العقد دون النظر إلى فترة التوقف التي دامت 8 أشهر.

5. الموعد المقرر لتسليم المرحلة الرابعة هو منتصف يولييه 2016.



المرحلة الرابعة - البدء في أعمال الخوازيق 19/2/2015



متابعة المرحلة الرابعة - 22/2/2015



لقاء مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضغط الجدول الزمني

24/2/2015

اللواء/ مصطفى العجوز- مدير إدارة أشغال الهيئة
العميد/ عبد الرحيم شتلت- قائد اللواء 150 إنشاءات بالهيئة



متابعة المرحلة الرابعة – 1/3/2015



المرحلة الرابعة - انتهاء أعمال الخوازيق 8/4/2015



المرحلة الرابعة - البدء في أعمال الأساسات 25/7/2015



المرحلة الرابعة - انتظام الأعمال 10/9/2015



المرحلة الرابعة - انتظام الأعمال 27/12/2015



المرحلة الرابعة - انتظام الأعمال 7/4/2016



1. الإنشاءات الجامعية:-

البنية التحتية:

1. لوحظ أن جميع المباني التي تُبنى وجاري العمل بها تمت دون وجود بنية تحتية.
2. تم اتخاذ العديد من الإجراءات لبدء العمل بالبنية التحتية، وتمت الترسيه على شركة المقاولون العرب بتكلفة إجمالية 215,730,780 جنيه (فقط مائتان وخمسة عشر مليوناً، وسبعمئة وثلاثون ألفاً، وسبعمئة وثمانون جنيهاً مصرياً).
3. بتاريخ 2/8/2015 وافقت وزارة التخطيط على صرف مبلغ الدفعة المقدمة لمشروع أعمال البنية التحتية من موازنة العام المالي 2015/2016، والبالغة 21,573,080 جنيه (واحد وعشرون مليوناً، وخمسمئة وثلاثة وسبعون ألفاً، وثمانون جنيهاً).



1. الإنشاءات الجامعية:-

البنية التحتية:

3. تم تنفيذ أعمال بقيمة 3,500,000 جنيه (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

4. تم اعتماد الرسومات الخاصة بأعمال الكهرباء والكهروميكانيكا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الكهرباء.

5. من المتوقع الانتهاء من أعمال هذه المرحلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام في يونيو 2015، حيث سيتم تنفيذ أعمال هذه المرحلة تباعاً وعلى مخطط زمني محدد، وذلك وفق العقد المبرم لتنفيذ أعمال هذه المرحلة مع شركة المقاولون العرب.



1. الإنشاءات الجامعية:-

- مبنى إدارة الجامعة، وعدد (4) مباني إدارية
للكليات بحرم الجامعة الجديد:

- تم الانتهاء من الرسومات التنفيذية الخاصة بإنشاء المبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، وعدد (4) مباني للكليات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وبما يتفق مع القانون لإسنادها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما أبدوه من إنجاز للأعمال والتزامات مادية بالمرحلة الرابعة الجاري تنفيذها، ولكن نظراً للفارق الشاسع بين القيمة التقديرية وما تقدمت به الهيئة، سيتم طرح المناقصة قريباً.



1. الإنشاءات الجامعية:-

تم استنفاد الخطة الاستثمارية بالكامل للعام المالي 2015/2016 بإجمالي (92) مليون جنيه، وبناء على طلب الجامعة، تم توفير مبلغ (25) مليون جنيه أخرى لصالح الخطة الاستثمارية للجامعة.



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

- التعيينات (الأكاديمية & الإدارية)
- بروتوكولات التعاون
- تفقد الكليات
- المدن الجامعية
- المؤتمرات والندوات



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

أولاً: الإعلان عن (119) وظيفة:

■ بتاريخ 9/11/2015 تم الإعلان عن عدد (119) وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك بعد مناقشة الاحتياجات الفعلية من التخصصات التي تحتاج إلى دعم في بعض الأقسام في كليات الجامعة في عدة جلسات لمجلس الجامعة ومجلس العمداء على النحو التالي:

1. مجلس الجامعة بجلسته رقم (43) في 30/3/2015م.
2. مجلس الجامعة بجلسته رقم (44) في 28/4/2015م (خاص باحتياجات كلية الزراعة – 18 قسم).
3. مجلس العمداء بجلسته في 25/6/2015م.
4. مجلس الجامعة بجلسته رقم (47) في 29/6/2015م.
5. مجلس العمداء في 28/8/2015م.

2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

■ وتمت الإجراءات جميعها طبقاً للاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات، وطبقاً لمعايير الجودة والنسب المسموح بها من قبل عدد الطلاب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

■ تم إصدار عدد (46) قرار خاص بتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المدرجين بالإعلان، وجارى فحص وفرز ملفات السادة المتقدمين للإعلان بمعرفة لجان متخصصة، كما تم إعادة الإعلان عن عدد (45) وظيفة التي لم يتم شغلها.



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

بيان بالوظائف الأكاديمية التي تم تعيينها من خلال الإعلان:

إجمالي	معيد	مدرس مساعد	مدرس	أستاذ مساعد	أستاذ
46	6	16	22	1	1

2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

ثانياً: الخطة الثلاثية:

- تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الخطة الثلاثية 2014-2016، ويتم التعيين بناءً على ما ورد من كليات الجامعة، وأقسامها المختلفة بشفافية ونزاهة.

الخطة الثلاثية 2014-2013	الخطة الثلاثية 2015-2014
تم تعيين 36 معيد	تم تعيين 39 معيد

2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

بيان بإجمالي التعيينات والترقيات خلال الفترة من 20/9/2014 حتى 20/6/2016 متضمناً التعيينات عن طريق الإعلان والخطبة الثلاثية

الكلية	الدرجة	أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	مدرس مساعد	معيد
الفنون التطبيقية	—	—	٥	١٣	٢٩	٨
الآداب	—	—	١	٩	١٩	٤
التربية	١	٥	٦	٥	١٢	١٢
الزراعة	٢	٢	١٠	١٦	٢٠	٢٠
التربية النوعية	—	٢	١١	١٠	٢٠	٢٠
التربية الرياضية	١	٧	٢٣	١٤	٢	٢
العلوم	١٠	٧	١٠	١٣	٢٣	٢٣
التجارة	١	٣	٦	١٠	٤	٤
الاجمالى	١٥	٣٢	٨٨	١١٦	٩٣	٩٣

2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

ثالثاً: القيادات الأكاديمية بالجامعة:

- تعيين عدد (3) نواب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
- تعيين عدد (3) مستشاري رئيس الجامعة.
- تعيين عدد (6) عمداء بموجب قرار جمهوري.
- تعيين عدد (45) وكلاء للكليات بقرار رئيس الجامعة.
- تعيين عدد (44) رؤساء أقسام بقرار رئيس جامعة.
- تعيين عدد (2) نائب رئيس مجلس قسم.



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

رابعاً: الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة:

- تجديد تعيين أمين عام الجامعة.
- تعيين أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية عن طريق الإعلان.
- تعيين أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية عن طريق الإعلان.
- تم تعيين عدد (7) بوظيفة مدير عام عن طريق الإعلان.
- تم تعيين عدد (10) بوظيفة قائم بعمل مدير عام.
- تم تعيين عدد (36) بوظيفة مدير إدارة.



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

رابعاً: الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة:

- تم تعيين عدد (27) من أوائل الخريجين حتى 30/6/2015.
- تم تعيين عدد (13) من نسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تم تعيين أكثر من (30) من حملة الماجستير والدكتوراه.
- تم تكليف عدد (8) أطباء ، وكذلك عدد (2) فني إشاعة.
- تم تثبيت عدد (32) موظف بالعمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة.
- تم تثبيت عدد (13) موظف بالعمالة المؤقتة بوظائف فنية ومكتبية وخدمات معاونة على موازنة الجامعة.



2. الكليات والخدمات الجامعية:-

التعيينات:

رابعاً: الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة:

- تم الإعلان عن عدد (45) وظيفة بتاريخ 16/6/2016 لتدعيم الجهاز الإداري والعمال والسائقين.

